

INCIDENT

Tijdens het hijsen van staal is er bij het draaien van de torenkraan een gebouw geraakt, met schade tot gevolg. Er raakte niemand gewond.

OORZAAK

De ingezette kraan had een grotere draaicirkel en kon zo binnen het bereik van het gebouw draaien. De op de kraan aanwezige zwenkbegrenzer was door de machinist niet ingesteld.


TOELICHTING

De geplande torenkraan is van een kleiner formaat dan de kraan die uiteindelijk op het project werd ingezet. De toegepaste torenkraan heeft een grotere draaicirkel, (ca. 16 m. extra) waardoor deze binnen het bereik van het gebouw kon komen.



BEHEERSMAATREGEL

- Controleer of het hijsplan overeenkomt met de geplande activiteiten;
- Pas bij wisseling van materieel het hijsplan en instructie aan;
- Maak indien nodig gebruik van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen van de machine (zoals begrenzer).

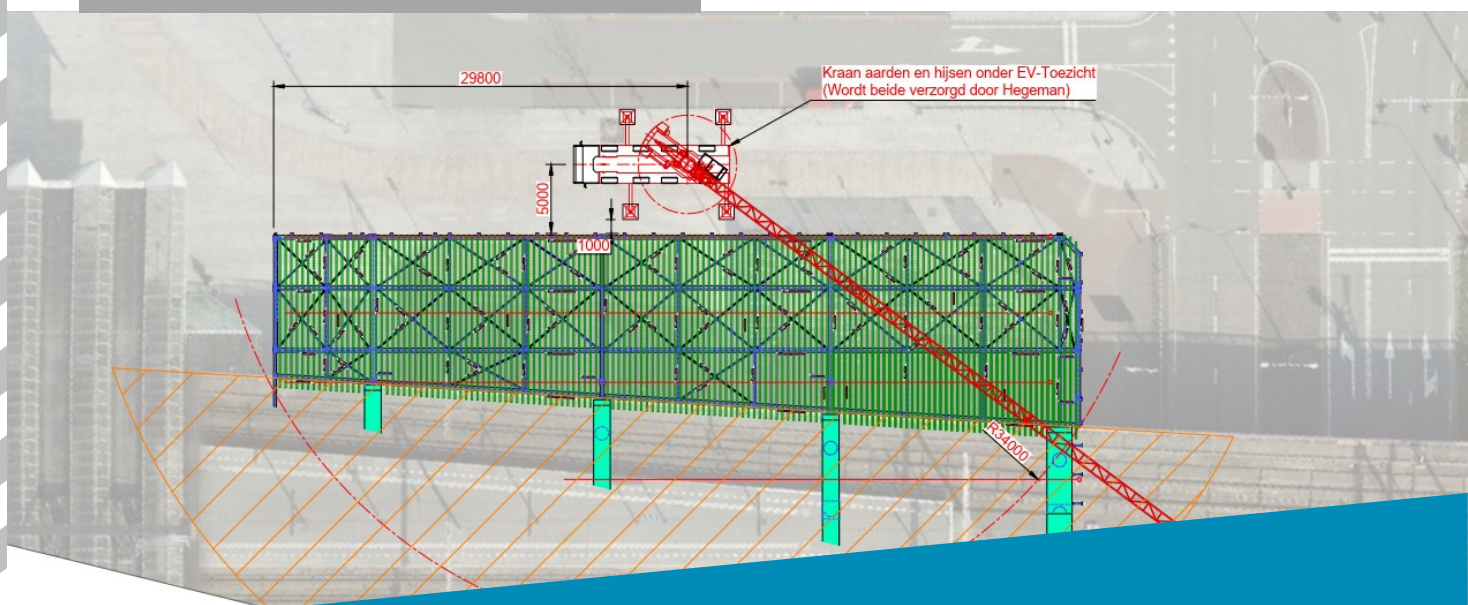

┌ Ik ben een positief voorbeeld ┌ Ik meld onveilige situaties ┌ Ik ben mij bewust van mijn omgeving
┌ Ik maak veiligheid bespreekbaar en spreek anderen aan op (on)veilig werken ┌ Ik voer uit volgens plan
